


个人发展规划网站 — 项目时间规划

1. 里程碑总览

阶段	产出内容	时间	状态
需求分析	项目需求梳理与确认	Day 1	已完成
UI/原型设计	设计稿 / 原型图确认	Day 2	已完成
开发完成	全部功能开发完毕	Day 3~5	已完成
测试优化	Bug 修复与优化	Day 6	已完成
项目收尾	本地演示准备与文档提交	Day 7	已完成

2. 甘特图

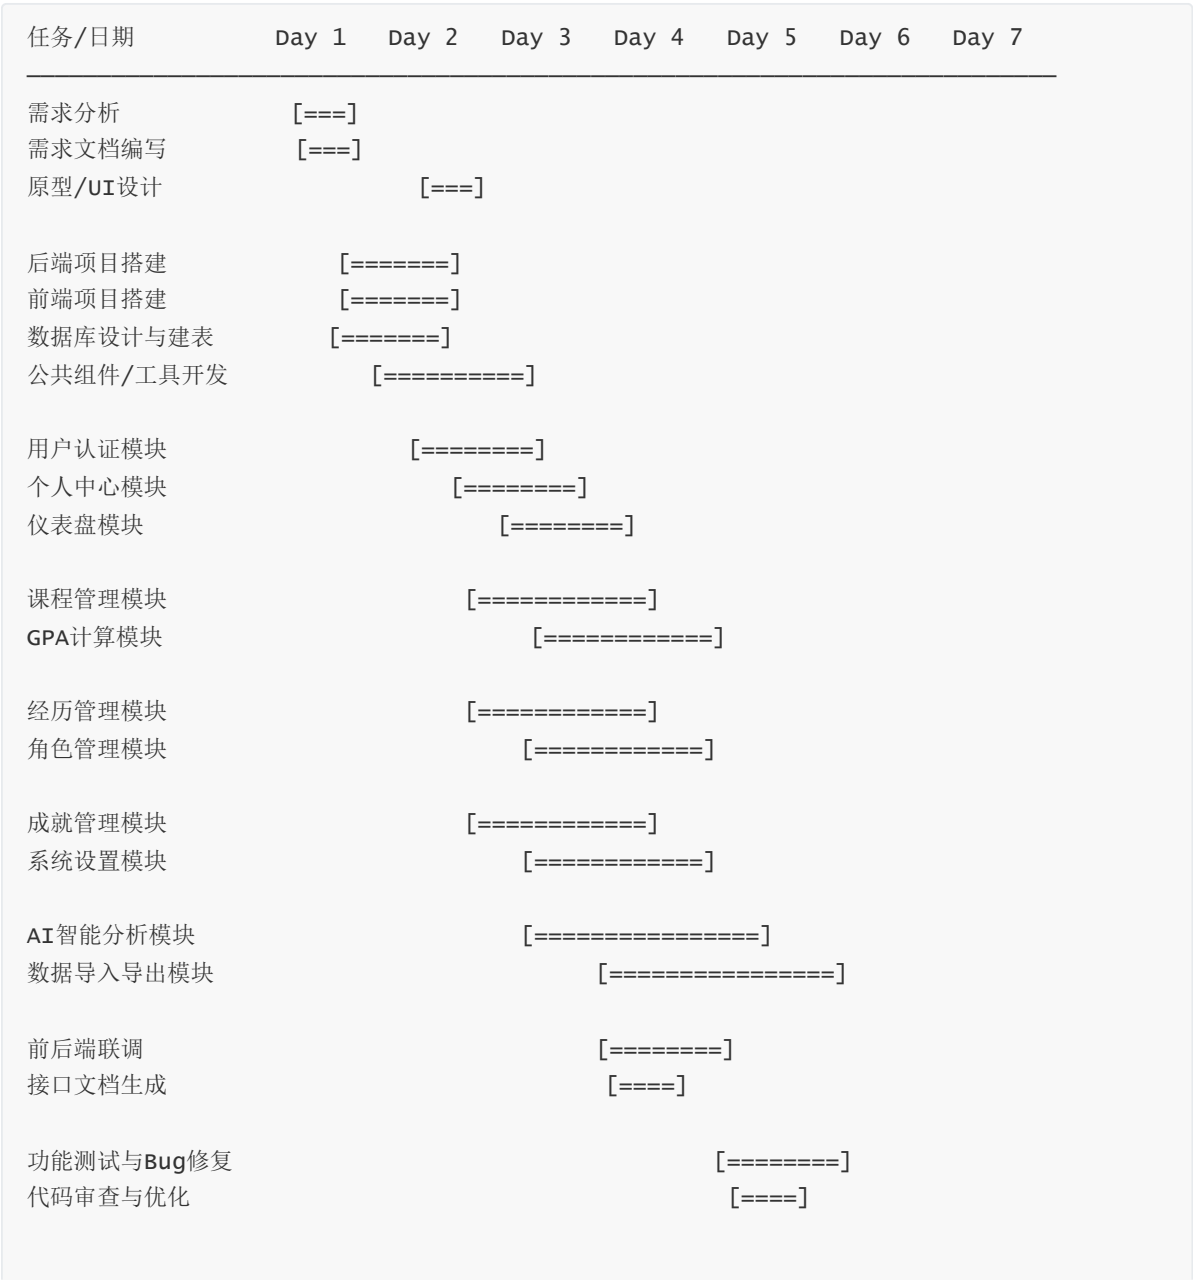

甘特图里每条横杠代表实际开发排期，基本和计划保持一致。

3. 详细任务分解

Day 1（2026-04-22） — 需求分析与项目初始化

第一天主要是把需求定下来，别让后面返工。我们先一起读了课程下发的项目要求，然后各自领了模块。

时间	任务	负责人	产出物
上午	项目需求分析讨论	全员	需求分析报告
下午	Spring Boot 后端项目搭建（Maven多模块、MyBatis、JWT）	ANGLER	可运行的后端骨架
晚上	Vue 3 + Vite 前端项目搭建（Element Plus、Router、Pinia）	ANGLER	可运行的前端骨架

实际执行：下午 ANGLER 搭后端的时候，pojo 模块一开始没注意 DTO/VO/Entity 的分层，后来 Day 2 统一调整好了。

Day 2（2026-04-23） — 数据库与公共基础设施

第二天搭基础，把公共模块和登录注册先跑通。

时间	任务	负责人	产出物
上午	MySQL 数据库创建 + 所有建表 SQL	ANGLER	数据库设计文档 + 初始SQL
上午	Axios 封装、JWT 拦截器、统一响应处理	ANGLER	request.js / JwtTokenInterceptor
下午	全局异常处理、Result 封装、分页工具类	ANGLER	common模块工具类
下午	登录/注册页面 UI 开发	ANGLER	login.vue / register.vue
晚上	顶部导航 + AppLayout 布局组件	ANGLER	AppLayout.vue

踩坑：JWT 拦截器里 ThreadLocal 没及时清理，导致后面测试时偶尔出现用户信息串了的问题，后来加了拦截器后置清理解决。

Day 3 (2026-04-24) — 核心模块并行开发

这一天是全员并行开发，各写各的模块。

时间	任务	负责人	产出物
全天	用户认证接口（注册/登录/JWT）	ANGLER	AuthController / UserController
全天	课程管理前后端 CRUD	Tian.	CourseController / courses.vue
全天	经历管理前后端 CRUD	幽昕	ExperienceController / experiences.vue
全天	成就管理前后端 CRUD	知时	AchievementController / achievements.vue
全天	AI分析接口设计与Prompt调试	~	AiAnalysisController（骨架）

经历模块的 `attachments` 字段一开始 DTO 写成了 String，但接口文档里明明写的是对象数组 `[{name, url}]`，联调时才发现，赶紧改成 `List<Map<String, String>>`。这个教训提醒我们：**写 DTO 之前一定要先看接口文档。**

Day 4 (2026-04-25) — 扩展模块并行开发

继续并行，把 GPA、角色、设置、导入导出这些模块补上。

时间	任务	负责人	产出物
全天	仪表盘数据聚合接口 + 页面	ANGLER	DashboardController / dashboard.vue
全天	GPA计算接口（4.0/5.0/百分制）+ 成绩页	Tian.	GpaController / grades.vue
全天	角色管理前后端 CRUD + 时间线视图	幽昕	RoleController / roles.vue
全天	系统设置前后端（GPA标准/AI维度）	知时	SettingController / settings.vue
全天	数据导入导出接口 + 文件上传	~	DataController / UploadController / data.vue

仪表盘前端当时是用假数据写的，想着后端 Day 5 再补，结果 Day 5 后端来不及做了，最后仪表盘后端接口是后来才补上的。不过前端页面本身一直能跑。

Day 5（2026-04-26） — AI模块与联调

AI 是项目的特色功能，这一天重点把 AI 链路打通，然后全员联调。

时间	任务	负责人	产出物
上午	AI分析完整链路（Prompt构建→调用→解析→保存）	~	AiAnalysisServiceImpl
上午	AI分析页面（维度选择+雷达图+报告渲染）	~	ai-analysis.vue
下午	前后端联调 — 课程/GPA模块	Tian. + ANGLER	联调通过
下午	前后端联调 — 经历/角色模块	幽昕 + ANGLER	联调通过
下午	前后端联调 — 成就/设置模块	知时 + ANGLER	联调通过
晚上	前后端联调 — AI分析/导入导出	~ + ANGLER	联调通过

AI 联调的时候遇到一个大坑：AI 接口响应特别慢，默认 10 秒超时根本不够，一直报错。后来把前端超时改成 120 秒，后端加了 try-catch 降级，才算解决。

Day 6（2026-04-27） — 测试与优化

全员测试，修 Bug，优化细节。

时间	任务	负责人	产出物
上午	功能测试 — 所有CRUD流程	全员	测试问题清单
下午	Bug修复 — 登录跳转、GPA图表、AI摘要渲染	ANGLER + Tian.	修复后的前端代码
下午	Bug修复 — Element Plus中文locale、导航栏	ANGLER	修复后的前端代码
晚上	代码审查与优化 — XSS过滤、错误提示、按钮类型	ANGLER	审查记录 + 修复代码
晚上	Swagger / Knife4j 接口文档最终确认	ANGLER	doc.html 可正常访问

这一天修的 Bug 比较多：

- 登录后偶尔不跳转 → 加了 setTimeout 延迟 + window.location.href 兜底

- GPA 百分制加权后柱状图高度溢出 → 改成按数据集最大值归一化
- AI 报告内容里有 HTML 标签直接显示 → 改成 `v-html` 渲染，同时加了 XSS 过滤
- Element Plus DatePicker 是英文 → 加了 `zh-cn` locale
- `ZCOOL xiaoWei` 字体导致某些字显示成黑框 → 直接移除了这个字体

Day 7 (2026-04-28) — 项目收尾与提交

最后一天，做本地演示准备，整理文档，准备提交。

时间	任务	负责人	产出物
上午	本地环境完整启动验证	ANGLER	启动录屏
下午	项目本地演示准备	ANGLER	演示环境可用
晚上	文档整理与提交（源码+文档）	全员	完整提交包

4. 实际执行偏差记录

计划日期	计划任务	实际完成日期	偏差原因
Day 5	全部联调完成	Day 5	按计划完成
Day 6	Bug修复完成	Day 6~7	AI接口超时问题需额外调试，花了比预期多的时间
Day 7	提交	Day 7	按计划完成

整体来说时间控制得还行，主要偏差是 AI 超时问题调试占用了 Day 6 晚上到 Day 7 上午的一部分时间，不过没有影响最终提交。

5. 资源投入

资源类型	数量	说明
开发人员	5人	前后端全栈分工，见详细分工表
开发环境	5套	每人本地 IDE + MySQL
测试环境	1套	本地演示电脑（ANGLER 的电脑）
AI API 密钥	1个	Kimi AI（开发阶段全组共用）

6. 遇到的问题与解决（实际发生的坑）

问题	应对措施	结果
AI服务调用超时	前端增加120秒超时，后端增加try-catch降级提示	已解决
GPA百分制加权溢出	前端柱状图改为按数据集最大值归一化	已解决
登录后偶尔不跳转	增加setTimeout延迟+window.location.href兜底	已解决
字体缺失导致显示异常	移除失效字体，回退系统默认字体	已解决
经历附件DTO类型写错	联调时发现，改为 <code>List<Map<String, String>></code>	已解决
Element Plus日期选择器英文	引入 <code>zh-cn</code> locale 配置	已解决
